





Označení činnosti	Název činnosti	Následující činnost	Doba trvání činnosti
A	Stanovení termínu opravy pece	B	9 měsíců
B	Objednání vyzdívkových materiálů	C	2 měsíce
C	Doprava materiálu	D	5 dní
D	Příprava mater. (řezání cihel)	E	105 hodin
E	Bourání klenby	F	95 hodin
F	Chlazení pece	G, I, J1, H	25 hodin
G	Bourání čelní stěny	K	25 hodin
H	Bourání boční stěny, spodní části	L1	120 hodin
I	Bourání boční stěny, horní části	N	65 hodin
J1	Bourání půdy-Mg	P, J2, L1, N	380 hodin
J2	Bourání půdy – Sh	O	110 hodin
K	Zděni čelní stěny	R, V	100 hodin
L1	Zděni boční stěny	L2, M	470 hodin
L2	Dozdívka boční stěny	R, V	70 hodin
M	Příprava bednění pro zdění klenby	R, V	30 hodin
N	Zděni boční stěny	R, V	340 hodin
O	Zděni půdy Sh	R, V	140 hod
P	Zděni půdy Mg	R, V	370 hodin
R	Zděni klenby	S	290 hodin
S	Vysoušení pece	T	30 hodin
T	Zaliti klenby maltou	U	10 hodin
U	Zasypání půdy Mg izolací	-	30 hodin
V	Čištění rekuperátoru	X, Y	160 hodin
X	Zděni rekuperátoru	-	30 hodin
Y	Zděni kouřovodu	-	20 hodin



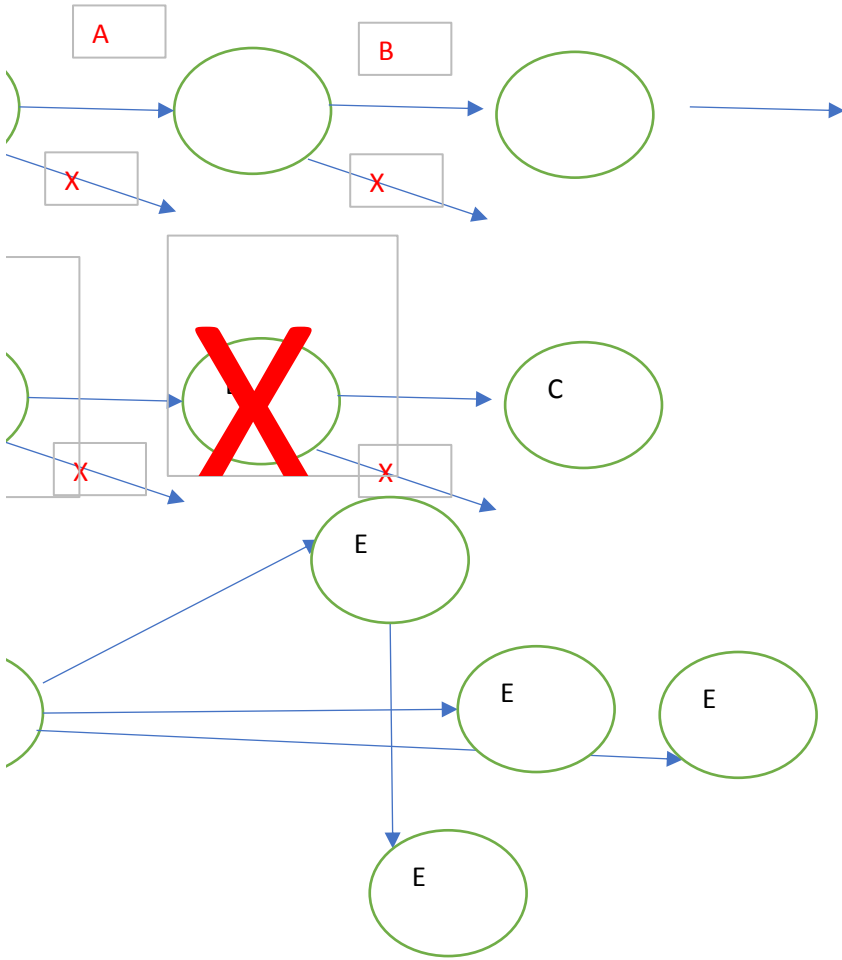

Označení činnosti	Název činnosti	Následující činnost	
A	Stanovení termínu opravy pece	B	9
B	Objednání vyzdívkových materiálů	C	2
C	Doprava materiálu	D	5
D	Příprava mater. (řezání cihel)	E	1
E	Bourání klenby	F	9
F	Chlazení pece	G, I, J1, H	2
G	Bourání čelní stěny	K	2
H	Bourání boční stěny, spodní části	L1	1
I	Bourání boční stěny, horní části	N	6
J1	Bourání půdy-Mg	P, J2, L1, N	3
J2	Bourání půdy – Sh	O	1
K	Zdění čelní stěny	R, V	1
L1	Zdění boční stěny	L2, M	4
L2	Dozdívka boční stěny	R, V	7
M	Příprava bednění pro zdění klenby	R, V	3
N	Zdění boční stěny	R, V	3
O	Zdění půdy Sh	R, V	1
P	Zdění půdy Mg	R, V	3
R	Zdění klenby	S	2
S	Vysoušení pece	T	3
T	Zaliti klenby maltou	U	1
U	Zasypání půdy Mg izolací	-	3
V	Čištění rekuperátoru	X, Y	1
X	Zdění rekuperátoru	-	3
Y	Zdění kouřovodu	-	2

Doba trvání činnosti
9 měsíců
2 měsíce
5 dní
105 hodin
25 hodin
25 hodin
25 hodin
120 hodin
55 hodin
180 hodin
110 hodin
100 hodin
170 hodin
70 hodin
30 hodin
140 hodin
140 hod
170 hodin
190 hodin
30 hodin
10 hodin
30 hodin
160 hodin
30 hodin
20 hodin

	C	D	E	F	G	H	I	J1	J2	K	L1	L2	M	N	O	P	R	S	T	U	V	X	Y	
C																								
D																								
E																								
F																								
G																								
H																								
I																								
J1																								
J2																								
K																								
L1																								
L2																								
M																								
N																								
O																								
P																								
R																								
S																								
T																								
U																								
V																								
X																								
Y																								

řád0	c	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	6	1	1	1	6	1	1	
řád1	d	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	6	1	1	1	6	1	1	
řád2	e	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	6	1	1	1	6	1	1	
řád3	f	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	6	1	1	1	6	1	1	
řád4	g,h,i,j1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	1	1	6	1	1	1	6	1	1
řád5	j2,k,l1,n,p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	6	1	1	1	6	1	1
řád6	l2, m,o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	3	1	1	
řád7	r,v,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1
řád8	s,x,y,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
řád9	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
řád10	u																				0			

Označení činnosti	Název činnosti	Následující činnosti
A	Stanovení termínu opravy pece	B
B	Objednání vyzdívkových materiálů	C
C	Doprava materiálu	D
D	Příprava mater. (řezání cihel)	E
E	Bourání klenby	F
F	Chlazení pece	G, I, J1, H
G	Bourání čelní stěny	K
H	Bourání boční stěny, spodní části	L1
I	Bourání boční stěny, horní části	N
J1	Bourání pudy-Mg	P, J2, L1, S
J2	Bourání pudy – Sh	O
K	Zděni čelní stěny	R, V
L1	Zděni boční stěny	L2, M
L2	Dozdívka boční stěny	R, V
M	Příprava bednění pro zdění klenby	R, V
N	Zděni boční stěny	R, V
O	Zděni pudy Sh	R, V
P	Zděni pudy Mg	R, V
R	Zděni klenby	S
S	Vysoušení pece	T
T	Zaliti klenby maltou	U
U	Zасыpání pudy Mg izolací	-
V	Čištění rekuperátoru	X, Y
X	Zděni rekuperátoru	-
Y	Zděni kouřovodu	-

ující ost	Doba trvání činnosti
	9 měsíců 2 měsíce 5 dní 105 hodin
I	95 hodin 25 hodin 25 hodin 120 hodin 65 hodin
N	380 hodin 110 hodin
	100 hodin 470 hodin 70 hodin 30 hodin 340 hodin 140 hod 370 hodin 290 hodin
	30 hodin 10 hodin 30 hodin 160 hodin 30 hodin 20 hodin

řád0 c
řád1 d
řád2 e
řád3 f
řád4 g,h,i,j1
řád5 j2,k,l1,n,p
řád6 l2, m,o
řád7 r,v,
řád8 s,x,y,
řád9 t
řád10 u

K
L2
M
N
O
P

